

新市建設計画進捗状況調査報告

（平成15年度～19年度）

平成20年5月

周南市総合政策部企画課

新市建設計画進捗状況調査 目次

1	調査の概要	1
1 - 1	調査の目的・趣旨	1
1 - 2	調査対象	1
1 - 3	新市建設計画	1
1 - 4	計画と実績の分析	2
2	事業計画	4
2 - 1	事業計画進捗状況の見方	4
2 - 2	全体概要	5
2 - 3	旧徳山市区域	7
2 - 4	旧新南陽市区域	8
2 - 5	旧熊毛町区域	9
2 - 6	旧鹿野町区域	10
2 - 7	その他（全域・複数区域）	11
2 - 8	新市建設計画進捗状況一覧	12
3	財政計画	18
3 - 1	財政計画の見方	18
3 - 2	新市建設計画（財政計画）と財政実績（決算）との比較	19
3 - 3	主な科目の比較（グラフ）	20

1 調査の概要

1 - 1 調査の目的・趣旨

平成15年4月21日に徳山市、新南陽市、熊毛町及び鹿野町の2市2町が合併して「周南市」が誕生した。以来5年が経過したが、その間、平成17年度よりまちづくり総合計画「ひと・輝きプラン 周南」がスタートし、“私たちが輝く元気発信都市 周南”という都市像に向けて、各分野において新しいまちづくりの取組がなされているところである。

しかしながら、合併直後から三位一体の改革をはじめとした国を挙げての行財政改革が進み、合併以前と比べて地方を取り巻く環境は大きく変化しており、景気回復後には地域間格差といった課題も顕著となってきた。

こうした状況を踏まえ、本調査は、合併して5年が経過した中、2市2町の合併協議において策定された「新市建設計画」の検証の1つとして、計画の「参考資料」に掲げられている事業、中でも進捗状況の把握が容易なハード事業について、その進捗状況を把握するとともに、その結果を平成22年度からスタートするまちづくり総合計画の後期基本計画につなげることを目的として実施したものである。

1 - 2 調査対象


新市建設計画の「参考資料」に掲載されているハード事業に係るもの。

1 - 3 新市建設計画

(1) 新市建設計画

新市建設計画¹は、2市2町それぞれの総合計画のほか、国・県の各種計画、広域行政圏計画、周南合併推進協議会策定の「Voice 21」等を踏まえて、合併協議の中で策定されたものである。

計画期間 平成15年度から平成24年度まで

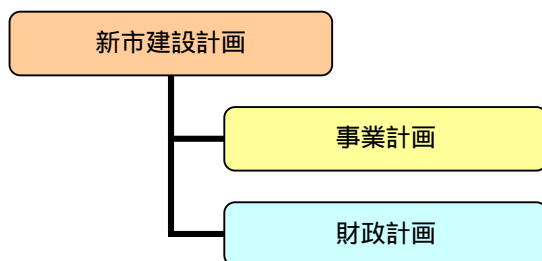

¹市町村建設計画とは、合併市町村がハード・ソフト両面の施策を総合的かつ効果的に推進するため、合併特例法に基づき、合併市町村のまちづくりの基本方針や合併市町村・都道府県が実施する事業等を内容として作成されるものである。

(2) 事業計画

新市のまちづくりにおいて特に重要な事業を“21のリーディングプロジェクト”として位置付けているほか、主要な施策として、都市基盤の整備や市民生活の向上等を目指して体系的に事業が掲げられている。「参考資料」には、各市町の総合計画に掲げられていた事業を中心に、合併協議の中で新たに追加された事業等を含め、より具体的な事業内容が示されている。

(3) 財政計画

新市の財政運営の指標であり、歳入・歳出の各科目ごとに、合併協議時の現況、過去の実績、国県等の中期財政計画及び経済情勢等を勘案しながら推計し、格差是正のための経費や財政支援措置等合併に伴う変動要因を考慮して作成されたものである。

1-4 計画と実績の分析

新市建設計画と合併後5年間の実績をみると、未だ多くの事業が未着手等の状態となっている。こうした状況の主な要因として、次のようなことが挙げられる。

- 新市建設計画の事業計画は、各市町の総合計画等の事業に加えて、合併協議の中で多くの事業が盛り込まれており、厳密に財政計画に基づいて国県の事業を含めすべての事業が積上げられた事業計画とはなっていなかった。
- 新市建設計画の策定後に国の三位一体の改革が実施されたため、平成16年度以降、改革の影響により財政計画において地方交付税等の歳入が大幅に減少した。
- 新市建設計画の策定時には、合併前と同額ベースでの推移を想定していた地方税の歳入が、実際は大幅に下回った。
- 大規模事業については、計画・検討に長期間を要するため、具体的な工事等の着手に至らなかった。
- 合併後のまちづくりは、新市建設計画の事業を中心にハード面の整備が行われてきたが、これ以外にも「まちづくり総合計画」に基づき主要なハード事業が実施されてきた。

例 地域資源活用促進施設整備事業（鹿野地区、豊鹿里パーク整備、H16完了）

田園自然環境保全整備事業（徳山地区、農道改良・休憩施設等整備、H19完了）

私立保育所施設整備費補助事業（新南陽地区、民間保育所新設整備補助、H18）

周南第1住宅建替事業（徳山地区、市営住宅建替、H16～）


道路改良事業：櫛ヶ浜馬屋線・佐保田平線（徳山地区）、東町塩田線（新南陽地区）、遠見白石線・高代松尾線（熊毛地区）、坂根秘密尾線・大平線・桶山線（鹿野地区）

周南緑道整備事業（徳山地区、緑地歩道整備、H19完了）


離島航路船舶建造事業（徳山地区、船舶建造費補助、H15・18） 等

新市建設計画の位置付け（イメージ図）

《合併協議》

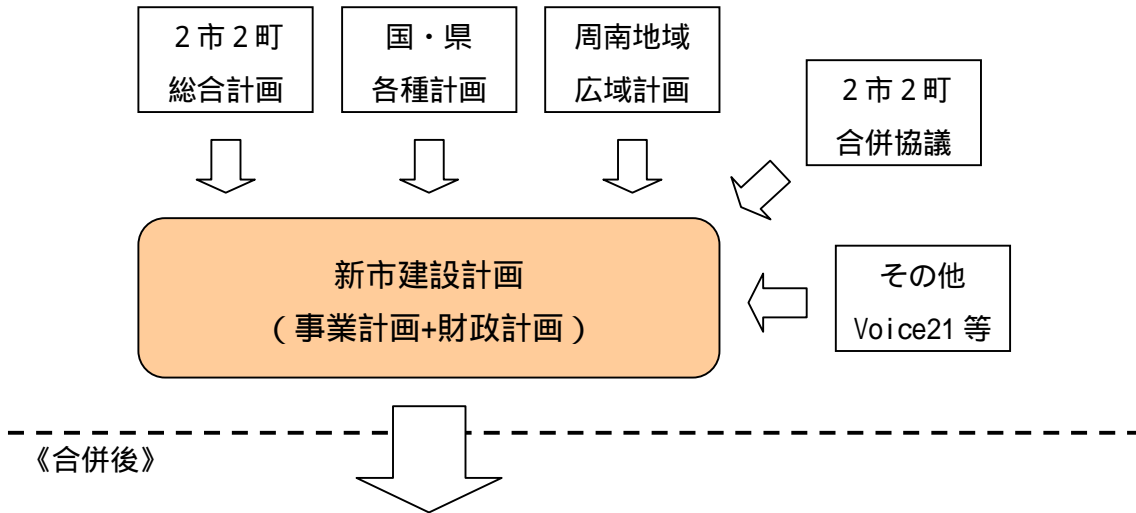


“ひと・輝きプラン 周南” 新市建設計画は、**総合計画に包含されている。**

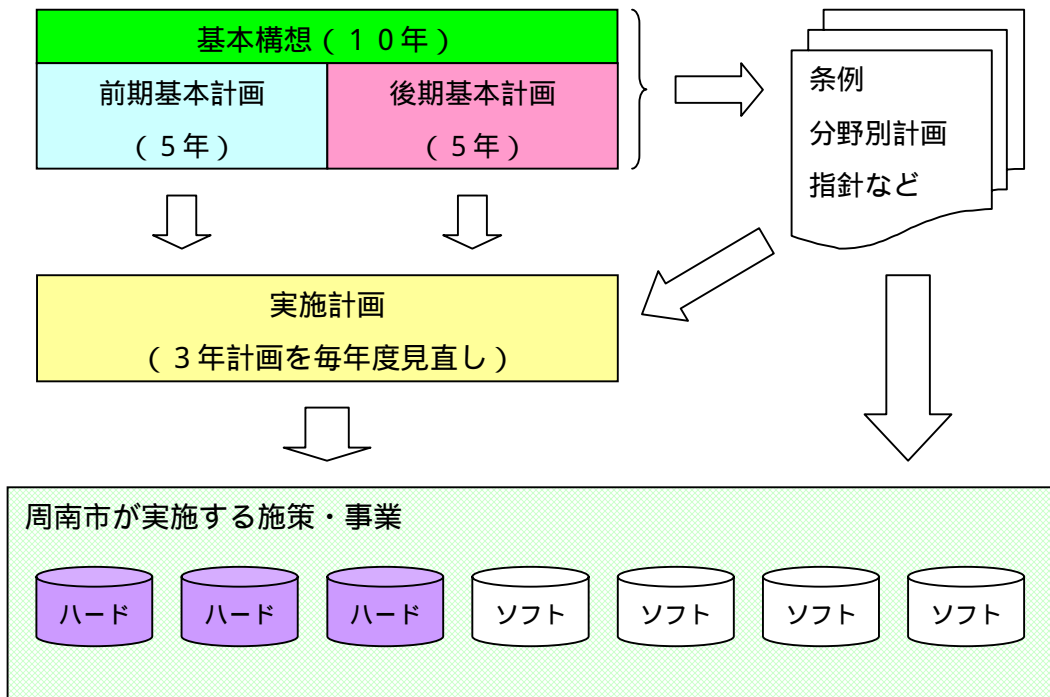

新市建設計画とまちづくり総合計画との関係

まちづくり総合計画

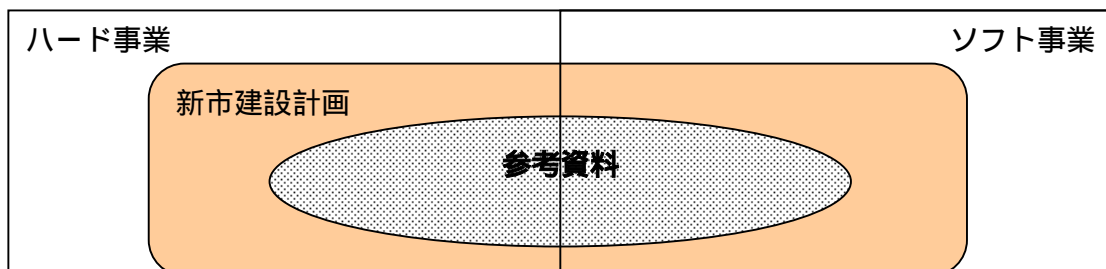

2 事業計画

2 - 1 事業計画進捗状況の見方

L P “ 2 1 のリーディングプロジェクト ” の略で、該当する事業に を記載している。

対象地区 各事業の実施場所や位置付けにより、旧 2 市 2 町、市内全域及び複数区域に区分している。

旧 2 市 2 町単位...実施場所や事業効果、利用者等の範囲が旧市町内に収まるもの。
市内全域 ...事業効果や利用者、行政サービス等の範囲が実施場所の旧市町を越えて市内全域にわたるもの。
複数区域 ...実施場所が複数の旧市町にまたがるもので、その事業効果等が市全域に及ばないもの。旧 2 市 2 町それぞれの頭文字(徳、新、熊、鹿) で表し、例えば、旧徳山区域と旧新南陽区域の場合は、欄中に「 徳 新 」と記載している。

実施主体 国、県、市、その他(民間等) に区分している。

進捗状況 以下の 6 つに分類している。

完了 ...合併後に事業が完了した。
継続実施...合併前から継続して実施している。
着手着工...合併後に着手・着工した。(調査・設計を含む。)
検討中 ...予算に計上されていないが、実施に向けて国・県や庁内で検討している。
未着手 ...検討されていない。
中断 ...着手・着工したが、何らかの事情で中断している。

事業費計 合併後から平成 1 8 年度までの決算額及び平成 1 9 年度の前算額の合計額であり、各年度の事業費は、国庫支出金、県支出金、地方債、一般財源及びその他財源の合計額となっている。実施主体が国・県の事業については、事業費を掲載せず、進捗状況のみを掲載している。

特例債 合併特例債²を充当した事業に を記載している。

備考 対象となる地区など事業内容に関する補足説明を記載している。


² 合併特例債とは、合併後の市町村が新市建設計画に基づいて行う一定の要件をみたく事業に要する経費等について、合併年度及びこれに続く 1 0 年度に限り、財源とすることができる特別な地方債である。対象事業費に充当できる割合(充当率) は 9 5 % で、この元利償還金の 7 0 % につき、後年度において交付税措置がある。

2 - 2 全体概要

調査対象事業

(件)

		計 (LP)	内訳			
			市 (LP)	国 (LP)	県 (LP)	他 (LP)
調査対象事業		212 (46)	157 (23)	5 (5)	43 (14)	7 (4)
対象地区	徳山	54 (17)	33 (5)	3 (3)	16 (8)	2 (1)
	新南陽	45 (4)	39 (2)	1 (1)	5 (1)	0 (0)
	熊毛	44 (4)	34 (3)	1 (1)	9 (0)	0 (0)
	鹿野	29 (2)	22 (1)	0 (0)	7 (1)	0 (0)
	その他(全域・複数)	40 (19)	29 (12)	0 (0)	6 (4)	5 (3)

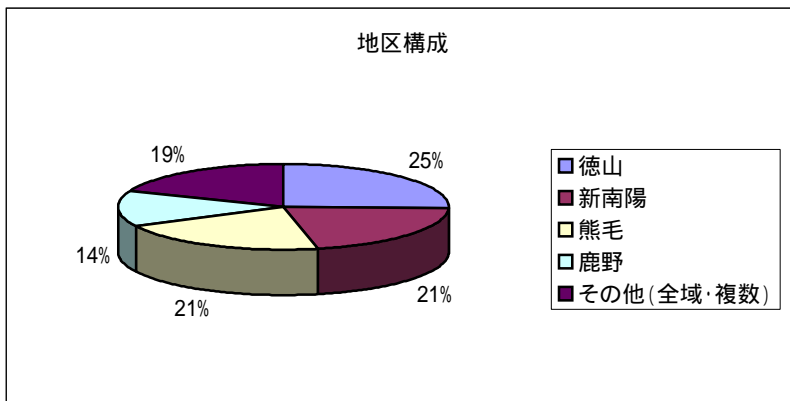


調査対象事業実施状況

(1) 全事業実施状況

(件)


		計 (LP)	内訳				
			徳山 (LP)	新南陽 (LP)	熊毛 (LP)	鹿野 (LP)	他 (LP)
事業数		212 (46)	54 (17)	45 (4)	44 (4)	29 (2)	40 (19)
実施状況	完了	38 (5)	9 (1)	9 (1)	7 (1)	7 (0)	6 (2)
	継続実施	50 (17)	12 (6)	12 (2)	8 (0)	4 (1)	14 (8)
	着手着工済	26 (8)	9 (3)	3 (0)	6 (0)	3 (1)	5 (4)
	検討中	11 (5)	3 (1)	1 (0)	2 (2)	0 (0)	5 (2)
	未着手	81 (11)	18 (6)	19 (1)	20 (1)	15 (0)	9 (3)
	中断	6 (0)	3 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)

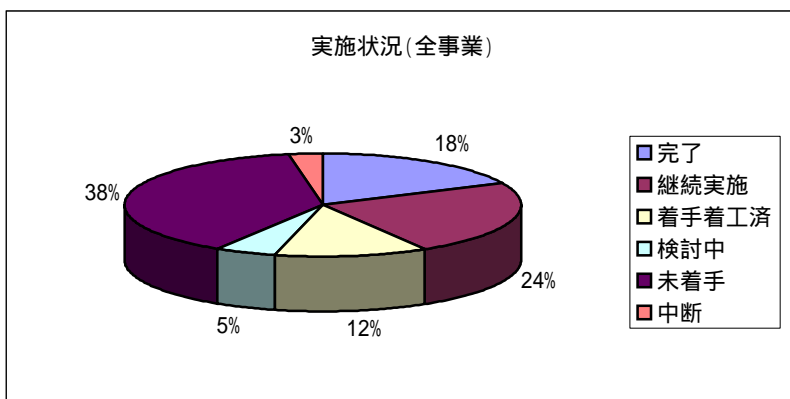

(2) 市事業実施状況

(件)

市事業のみ	計 (LP)	内訳					
		徳山 (LP)	新南陽 (LP)	熊毛 (LP)	鹿野 (LP)	他 (LP)	
事業数	157 (23)	33 (5)	39 (2)	34 (3)	22 (1)	29 (12)	
実施状況	完了	29 (1)	7 (0)	8 (0)	4 (1)	6 (0)	4 (0)
	継続実施	27 (9)	4 (2)	8 (1)	4 (0)	1 (0)	10 (6)
	着手着工済	18 (5)	6 (2)	2 (0)	6 (0)	1 (1)	3 (2)
	検討中	8 (4)	1 (0)	1 (0)	2 (2)	0 (0)	4 (2)
	未着手	69 (4)	12 (1)	19 (1)	17 (0)	14 (0)	7 (2)
	中断	6 (0)	3 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)

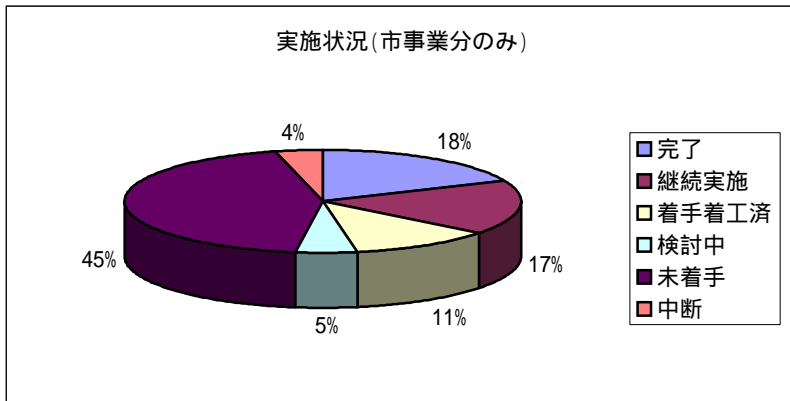

2 - 3 旧徳山市区域


(件)

		計 (LP)	内訳			
			市 (LP)	国 (LP)	県 (LP)	他 (LP)
事業数		54 (17)	33 (5)	3 (3)	16 (8)	2 (1)
実施状況	完了	9 (1)	7 (0)	0 (0)	2 (1)	0 (0)
	継続実施	12 (6)	4 (2)	1 (1)	7 (3)	0 (0)
	着手着工済	9 (3)	6 (2)	1 (1)	2 (0)	0 (0)
	検討中	3 (1)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)
	未着手	18 (6)	12 (1)	1 (1)	5 (4)	0 (0)
	中断	3 (0)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

主な徳山地区事業

徳山駅周辺整備事業

徳山下松港港湾整備事業

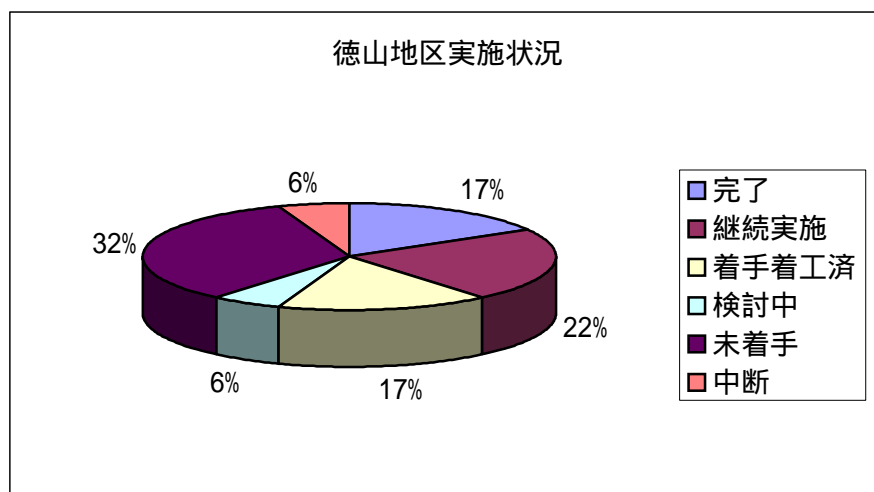

2 - 4 旧新南陽市区域


(件)

		計 (LP)	内訳			
			市 (LP)	国 (LP)	県 (LP)	他 (LP)
事業数		45 (4)	39 (2)	1 (1)	5 (1)	0 (0)
実施状況	完了	9 (1)	8 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)
	継続実施	12 (2)	8 (1)	1 (1)	3 (0)	0 (0)
	着手着工済	3 (0)	2 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)
	検討中	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	未着手	19 (1)	19 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	中断	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

主な新南陽地区事業

徳山下松港港湾整備事業

福川駅前周辺整備事業

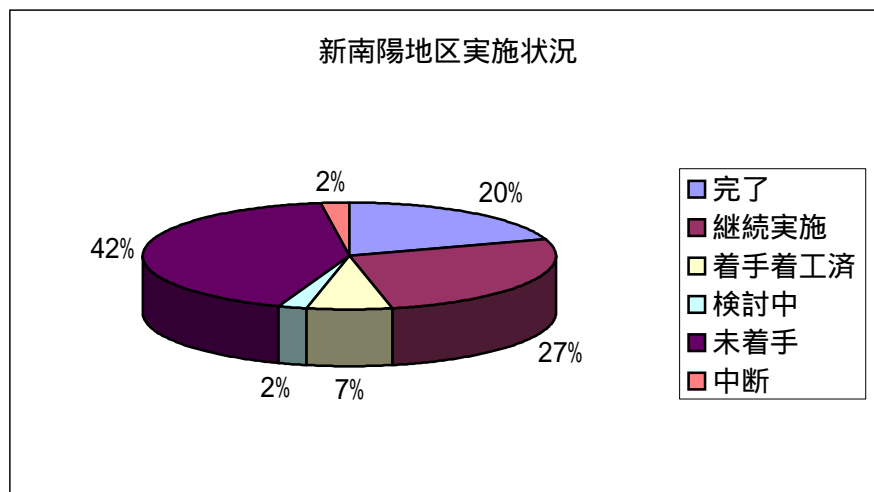

2 - 5 旧熊毛町区域


(件)

		計 (LP)	内訳			
			市 (LP)	国 (LP)	県 (LP)	他 (LP)
事業数		44 (4)	34 (3)	1 (1)	9 (0)	0 (0)
実施状況	完了	7 (1)	4 (1)	0 (0)	3 (0)	0 (0)
	継続実施	8 (0)	4 (0)	0 (0)	4 (0)	0 (0)
	着手着工済	6 (0)	6 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	検討中	2 (2)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	未着手	20 (1)	17 (0)	1 (1)	2 (0)	0 (0)
	中断	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

主な熊毛地区事業

コアプラザ熊毛整備事業

水道施設整備事業

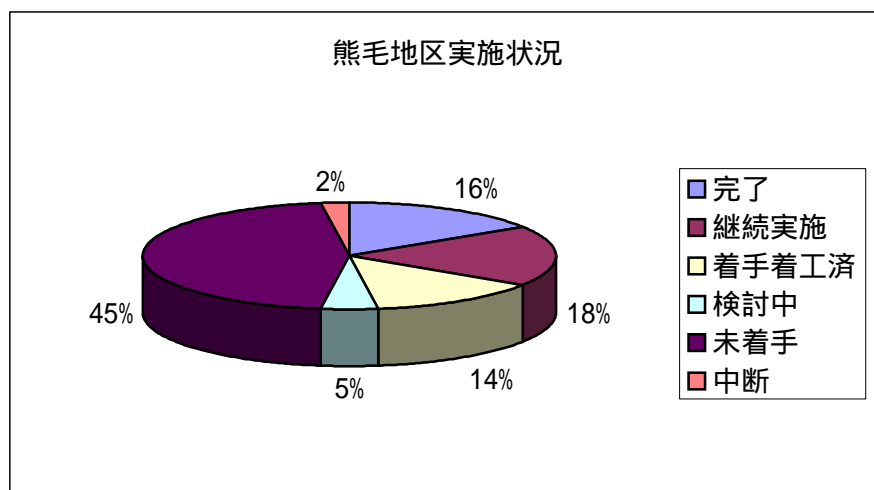


2 - 6 旧鹿野町区域

(件)

		計 (LP)	内訳			
			市 (LP)	国 (LP)	県 (LP)	他 (LP)
事業数		29 (2)	22 (1)	0 (0)	7 (1)	0 (0)
実施状況	完了	7 (0)	6 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)
	継続実施	4 (1)	1 (0)	0 (0)	3 (1)	0 (0)
	着手着工済	3 (1)	1 (1)	0 (0)	2 (0)	0 (0)
	検討中	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	未着手	15 (0)	14 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)
	中断	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

主な鹿野地区事業

コアプラザ鹿野整備事業

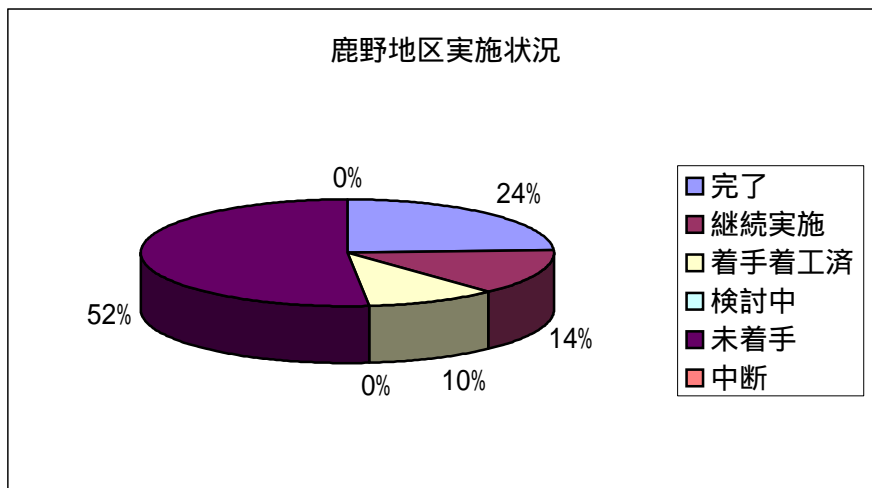


2 - 7 その他（全域・複数区域）

（件）

		計 (LP)	内訳			
			市 (LP)	国 (LP)	県 (LP)	他 (LP)
事業数		40 (19)	29 (12)	0 (0)	6 (4)	5 (3)
実施状況	完了	6 (2)	4 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (1)
	継続実施	14 (8)	10 (6)	0 (0)	4 (2)	0 (0)
	着手着工済	5 (4)	3 (2)	0 (0)	1 (1)	1 (1)
	検討中	5 (2)	4 (2)	0 (0)	0 (0)	1 (0)
	未着手	9 (3)	7 (2)	0 (0)	0 (0)	2 (1)
	中断	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

主な事業

- 新市庁舎建設事業
- 地域情報通信基盤整備事業
- 学び・交流プラザ整備事業
- 学校給食センター整備事業
- リサイクルプラザ整備事業

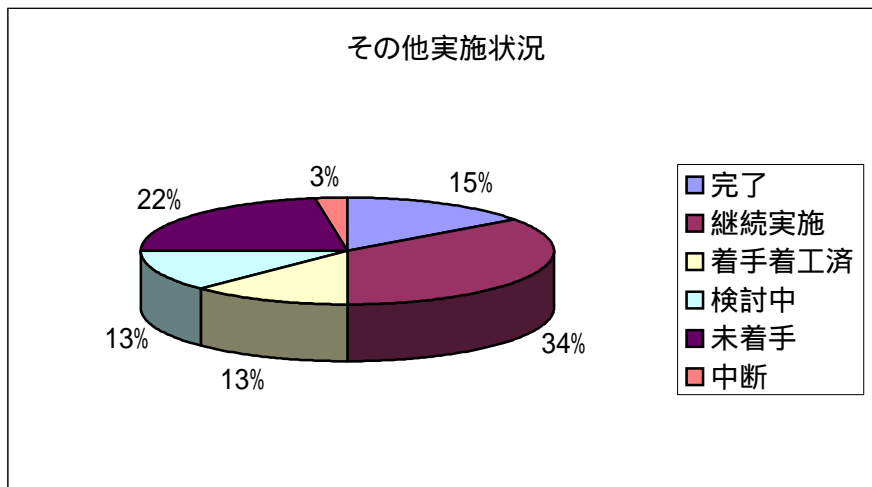

2 - 8 新市建設計画進捗状況一覧

調査年度H19

No	分野	事業名	LP	対象地区	実施主体	完了	継続実施	着手着手	検討中	未着手	中断	事業費計	年度別内訳(千円)					特例費	備考	No	
													15	16	17	18	19				
1	地域拠点施設	徳山駅周辺整備事業		徳山	市							670,980	4,201	17,588	37,703	522,655	88,833			1	
2		(仮称)コアプラザ熊毛整備事業		熊毛	市							0	0	0	0	0	0		H20着手予定(調査設計)	2	
3		(仮称)コアプラザ鹿野整備事業		鹿野	市							167,305	0	0	0	0	167,305		H20完了予定	3	
4		和田地区総合庁舎整備事業		新南陽	市							0	0	0	0	0	0			4	
5		戸田駅前活性化施設整備事業		徳山	市							81,531	1,555	0	5,985	30,991	43,000			5	
6		福川駅前周辺整備事業		新南陽	市							0	0	0	0	0	0			6	
7	国道	周南道路整備事業		徳新	その他															7	
8		国道2号戸田地区4車線化		徳山	国																8
9		国道2号三田川交差点の改良		徳山	国																9
10		国道2号熊毛4車線化		熊毛	国																10
11		国道315号栄谷線トンネルの整備		徳山	山口県																11
12		国道315号横瀬地区交通安全施設		徳山	山口県															向道	12
13		国道315号交通安全施設		鹿野	山口県															鹿野中	13
14		国道376号須々万地区バイパス整備		徳山	山口県																14
15		国道489号大神地区交通安全施設整備		新南陽	山口県																15
16		県道	中央通線(下松新南陽線)改良		徳山	山口県														久米	16
17			中央通線(下松新南陽線)改良		徳新	山口県														徳山浦山～新南陽古川、調査設計	17
18			西原安田線 期		熊毛	山口県														原	18
19			新南陽停車場線(新南陽津和野線)街路事業		徳新	山口県														新南陽土井～徳山下上土井	19
20			県道和田上村線改良		徳山	山口県														井谷	20
21			県道徳山新南陽線(産業道路)改良		新南陽	山口県															
22	県道下松鹿野線道路拡幅改良			徳山	山口県														須々万	22	
23	県道下松鹿野線道路拡幅改良			鹿野	山口県														鹿野金峰	23	
24	県道徳山本郷線道路拡幅改良			徳山	山口県														須金	24	
25	県道鹿野夜市線改良			徳山	山口県														夜市	25	
26	県道新南陽津和野線交通安全施設整備			徳山	山口県														菊川、調査設計	26	
27	県道山口徳山線改良			徳山	山口県														湯野	27	
28	県道徳山光線道路拡幅改良			熊毛	山口県														奥関谷	28	
29	県道瀬越下松線改良			熊毛	山口県														八代	29	
30	県道串戸田線改良			新南陽	山口県														馬神	30	
31	県道串戸田線改良			徳山	山口県														湯野	31	
32	県道久杉高水停車場線改良			熊毛	山口県														樋口	32	
33	県道下松田布施線改良			熊毛	山口県														大河内	33	
34	県道徳山徳地線道路拡幅改良			鹿野	山口県														鹿野下	34	
35	県道鹿野吉賀線改良			鹿野	山口県														鹿野上	35	
36	市道	大迫田代々木線街路築造工事		徳山	市							0	0	0	0	0	0			36	
37		大神線(中溝線)街路事業		新南陽	市							303,477	96,229	67,550	36,556	57,142	46,000		H20完了予定	37	

No	分野	事業名	LP	対象地区	実施主体	完了	継続実施	着手工事	検討中	未着手	中断	事業費計	年度別内訳(千円)					特例債	備考	No
													15	16	17	18	19			
38	市道	川崎平野線等街路事業		新南陽	市							100,596	49,918	50,678	0	0	0	第1期L=310m完了	38	
39		中開作線街路事業		新南陽	市							0	0	0	0	0	0		39	
40		西原安田線		熊毛	市							0	0	0	0	0	0	原	40	
41		高水笠野線新設(第1期)		熊毛	市							0	0	0	0	0	0		41	
42		高水笠野線新設(第2期)		熊毛	市							0	0	0	0	0	0		42	
43		本町中村線新設		熊毛	市							0	0	0	0	0	0		43	
44		ふれあい徳修線新設		熊毛	市							0	0	0	0	0	0		44	
45		栗屋線改良		徳山	市							64,554	26,140	18,718	19,696	0	0		45	
46		市赤迫線		徳山	市							144,512	100,832	43,680	0	0	0	夜市	46	
47		ふれあいロード歩道設置		新南陽	市							0	0	0	0	0	0	政所、清水	47	
48		中開作線改良		新南陽	市							0	0	0	0	0	0	室尾	48	
49		野村一丁目7号線改良		新南陽	市							134,232	30,000	71,997	32,235	0	0	野村1・2	49	
50		秋字明葉山線道路拡幅改良		新南陽	山口県													高瀬	50	
51		大河内笠野線改良		熊毛	市							49,963	0	0	0	35,763	14,200	大河内	51	
52		小深線改良		熊毛	市							17,724	0	0	2,205	3,019	12,500	小松原	52	
53		勝間中村線改良		熊毛	市							61,094	0	5,387	489	32,218	23,000	呼坂	53	
54		東善寺線改良		熊毛	市							0	0	0	0	0	0	小松原	54	
55		呼坂仏坂線改良		熊毛	市							86,300	50,000	30,000	0	0	6,300	奥関谷	55	
56		新清光台団地第一幹線改良		熊毛	市							4,289	0	0	0	3,089	1,200	呼坂	56	
57		勝間原団地第1幹線		熊毛	市							6,434	0	0	0	4,634	1,800	呼坂	57	
58		丘陽大江線改良		熊毛	市							0	0	0	0	0	0	呼坂	58	
59		太陽寺線改良		熊毛	市							16,482	13,773	2,709	0	0	0	八代	59	
60		安田笠野線改良		熊毛	市							0	0	0	0	0	0	安田・大河内	60	
61		黒岩線改良		熊毛	市							65,364	11,572	25,732	14,595	3,465	10,000	小松原	61	
62		下石ヶ谷線新設		鹿野	市							0	0	0	0	0	0	鹿野上	62	
63		大泉線改良		鹿野	市							40,789	0	0	13,223	27,566	0	鹿野下	63	
64		片山線改良		鹿野	市							0	0	0	0	0	0	大潮	64	
65	西谷線改良		鹿野	市							0	0	0	0	0	0	鹿野中	65		
66	小泉線小泉橋改良		鹿野	市							0	0	0	0	0	0	鹿野下	66		
67	大潮小河内線改良		鹿野	市							0	0	0	0	0	0	大潮	67		
68	久米中央土地区画整理事業		徳山	市							3,174,332	657,723	579,367	521,258	673,467	742,517		68		
69	富田西部第一土地区画整理事業		新南陽	市							2,155,963	455,063	400,196	351,318	429,386	520,000		69		
70	熊毛中央土地区画整理事業		熊毛	市							904,674	203,000	164,953	107,205	222,416	207,100	H20完了予定	70		
71	公営住宅	高尾住宅建替事業		徳山	市						519,967	519,967	0	0	0	0		71		
72		県営旭ヶ丘・周南団地建替事業		徳山	山口県														72	
73		羽島住宅他建替事業		新南陽	市							0	0	0	0	0	0		73	
74		八代住宅建替事業		熊毛	市							81,858	81,858	0	0	0	0		74	
75		高水住宅建替事業		熊毛	市							0	0	0	0	0	0		75	
76		大地庵住宅建替事業		鹿野	市							0	0	0	0	0	0	鹿野上	76	
77		柏屋住宅建替事業		鹿野	市							0	0	0	0	0	0	鹿野上	77	

No	分野	事業名	LP	対象地区	実施主体	完了	継続実施	着手着手	検討中	未着手	中断	事業費計	年度別内訳(千円)					特例債	備考	No
													15	16	17	18	19			
78	公園	公園リフレッシュ事業		徳山	市							10,400	0	0	0	10,400	0	H18児玉公園完了	78	
79		周南緑地整備事業		徳山	市							1,162,406	0	28,123	340,687	464,800	328,796	H18周南フレンドパーク完成	79	
80		永源山公園整備事業		新南陽	市							226,094	29,496	27,403	22,195	67,000	80,000		80	
81		辰尾公園整備事業		新南陽	市							0	0	0	0	0	0	福川	81	
82		公園リフレッシュ事業		新南陽	市							0	0	0	0	0	0		82	
83		長田南街区公園整備事業		新南陽	市							13,590	0	0	11,999	1,591	0	長田町	83	
84		長田北街区公園整備事業		新南陽	市							0	0	0	0	0	0	長田町	84	
85		新町東街区公園整備事業		新南陽	市							0	0	0	0	0	0	土地区画整理事業区域内	85	
86		古市街区公園整備事業		新南陽	市							0	0	0	0	0	0	土地区画整理事業区域内	86	
87		浜田親水公園整備事業		新南陽	市							0	0	0	0	0	0	土地区画整理事業区域内	87	
88		総合スポーツ施設整備事業		熊毛	市							0	0	0	0	0	0		88	
89		高水近隣公園整備事業		熊毛	市							388,690	116,075	51,270	73,345	63,000	85,000		89	
90		大河内近隣公園整備事業		熊毛	市							0	0	0	0	0	0		90	
91	鶴見台街区公園整備事業		熊毛	市							101,695	71,695	30,000	0	0	0		91		
92	合併記念公園化事業		全域	市							0	0	0	0	0	0		92		
93	ポケットパーク整備事業		全域	市							0	0	0	0	0	0		93		
94	上下水道	市内老朽管の計画的更新事業		全域	市							214,162	17,328	26,607	36,801	60,437	72,989	水道事業、簡易水道事業	94	
95		水道未普及地域への水道施設整備		熊毛	市							4,435	0	0	0	3,098	1,337		95	
96		水道水質検査センターの改築及び検査機器の整備事業		全域	市							68,775	0	0	0	7,350	61,425	水道事業	96	
97		夜市戸田湯野水道給水区区域拡張事業		徳山	市							0	0	0	0	0	0	水道事業	97	
98		福川地区配水池築造事業		新南陽	市							0	0	0	0	0	0	水道事業	98	
99		公共下水道施設整備事業(処理場ほか)		徳新	市							2,479,560	171,434	588,525	282,058	619,043	818,500		99	
100		公共下水道建設事業(污水管渠)		徳新熊	市							2,498,888	534,442	505,073	421,860	584,283	453,230		100	
101		特定環境保全下水道建設事業(污水管渠)		徳新鹿	市							942,974	127,286	167,520	191,759	227,139	229,270		101	
102		公共下水道合流改善対策事業		徳山	市							36,000	0	0	0	6,000	30,000	調査設計	102	
103		公共下水道建設事業(変更認可事務)		全域	市							27,430	0	0	27,430	0	0	調査設計	103	
104		公共下水道建設事業(雨水)		徳新熊	市							812,420	294,220	157,300	142,500	90,400	128,000		104	
105		公共下水道建設事業(雨水ポンプ場)		新南陽	市							459,480	104,000	0	17,800	184,680	153,000	新地ポンプ場整備ほか	105	
106		八代地区農業集落排水施設整備事業		熊毛	市							984,741	258,300	348,090	185,735	59,588	133,028		106	
107	合併処理浄化槽整備推進事業		全域	市							180,485	55,302	40,095	30,800	20,593	33,695		107		
108	行政	山口県総合庁舎建設事業		全域	山口県													H16完成	108	
109		新庁舎建設の検討		全域	市							0	0	0	0	0	0		109	
110		地域情報通信基盤整備事業		全域	その他							996,202	533,050	235,047	162,527	65,578	0	CATV網整備補助	110	
111		富田地区コミュニティセンター		新南陽	市							0	0	0	0	0	0		111	
112	文化・スポーツ	図書館システム統合事業		全域	市							101,472	0	101,472	0	0	0		112	
113		学び・交流プラザ整備事業		全域	市							0	0	0	0	0	0		113	
114		文化会館整備事業(文化会館5ヵ年整備事業)		全域	市							205,694	89,228	45,276	71,190	0	0		114	
115		県指定文化財「山田家本屋」の解体復元		徳山	市							52,967	52,967	0	0	0	0		115	
116		鶴保護施設整備事業		熊毛	市							252,084	20,190	50,044	59,073	72,527	50,250	H20完了予定	116	
117	移動図書館(専用車3台)		全域	市							0	0	0	0	0	0		117		

No	分野	事業名	LP	対象地区	実施主体	完了	継続実施	着手着手	検討中	未着手	中断	事業費計	年度別内訳(千円)					特例債	備考	No
													15	16	17	18	19			
118	文化・スポーツ	新南陽体育館建替事業		新南陽	市							0	0	0	0	0	0		118	
119		鹿野庭球場改修事業		鹿野	市							0	0	0	0	0	0		119	
120		鹿野プール改修事業		鹿野	市							0	0	0	0	0	0		120	
121		天体観測施設整備事業		鹿野	市							0	0	0	0	0	0		121	
122	レクリエーション	ファンタジアファーム整備事業		全域	市							0	0	0	0	0	0		122	
123		大津島海洋レクリエーション拠点整備		徳山	市							0	0	0	0	0	0		123	
124		長田海浜公園整備(レクリエーション施設整備)		新南陽	市							0	0	0	0	0	0		124	
125	福祉	在宅介護支援センター建設		新南陽	市							8,794	8,794	0	0	0	0	老人保健施設に併設	125	
126		特別養護老人ホーム「鼓海園」移転建替事業		徳山	その他														126	
127		介護老人保健施設の整備		新南陽	市							1,080,234	1,080,234	0	0	0	0		127	
128		デイサービスセンター(高齢者生活福祉センター等)の整備		新南陽	市							0	0	0	0	0	0		128	
129		養護老人ホーム「きさんの里」移転建替事業		全域	その他													周南地区福祉施設組合(周南市・下松市)で運営	129	
130		超低床ノンステップバス導入事業		全域	その他							2,069	0	0	617	428	1,024	バス事業者への補助	130	
131	救護施設「周南荘」改築建設事業		全域	その他													周南地区福祉施設組合(周南市・下松市)で運営	131		
132	子育て・教育	福川南児童館建設事業		新南陽	市							79,815	0	79,815	0	0	0		132	
133		乳児保育園移転事業		新南陽	市							19,736	0	0	0	8,894	10,842	既設保育所の改修で対応	133	
134		保育所整備事業		全域	市							57,584	19,937	13,198	9,014	9,660	5,775		134	
135		徳山小学校屋体・プール建設事業		徳山	市							541,827	174,450	367,377	0	0	0		135	
136		岐山小学校屋体改築事業		徳山	市							0	0	0	0	0	0	H20着手予定(調査設計)	136	
137		中須小学校校舎・屋体改築事業		徳山	市							0	0	0	0	0	0		137	
138		桜田中学校屋体改築事業		徳山	市							0	0	0	0	0	0		138	
139		大道理小学校屋体改築事業		徳山	市							351,511	1,365	350,146	0	0	0		139	
140		菊川中学校屋体改築事業		徳山	市							0	0	0	0	0	0		140	
141		住吉中学校屋体改築事業		徳山	市							0	0	0	0	0	0		141	
142		遠石小学校屋体建設事業		徳山	市							0	0	0	0	0	0		142	
143		太華中学校校舎・屋体建設事業		徳山	市							373,752	0	6,269	7,026	0	360,457		143	
144		和田中学校校舎改築事業		新南陽	市							6,900	0	0	0	0	6,900	調査設計	144	
145		三丘小学校校舎大規模改修事業		熊毛	市							0	0	0	0	0	0		145	
146		八代小学校校舎・屋体改築事業		熊毛	市							0	0	0	0	0	0		146	
147		熊毛中学校校舎・屋体大規模改修事業		熊毛	市							0	0	0	0	0	0		147	
148		鹿野小学校屋体改築事業		鹿野	市							351,369	0	5,250	10,018	298,769	37,332	小中学校兼用屋体建設	148	
149		鹿野中学校屋体改築事業		鹿野	市							0	0	0	0	0	0		149	
150		教職員住宅改築		鹿野	市							0	0	0	0	0	0		150	
151		学校給食センター建設事業		全域	市							723,932	0	0	0	723,932	0	新市建設計画では東部、北部	151	
152		情報教育推進事業		全域	市							171,181	0	67,675	0	0	103,506	学習用パソコン整備	152	
153	青少年研修施設		全域	市							0	0	0	0	0	0		153		
154	安心安全	消防緊急通信指令システムの整備		徳新鹿	市							1,775,235	885,276	889,959	0	0	0		154	
155		防災情報システムの整備		全域	市							0	0	0	0	0	0		155	
156		高規格救急車の適正配置(6台)		徳新鹿	市							109,975	13,574	29,022	33,117	34,262	0		156	
157		救急救命士の増員		徳新鹿	市							22,167	2,463	7,389	4,926	2,463	4,926		157	

No	分野	事業名	LP	対象地区	実施主体	完了	継続実施	着手着手	検討中	未着手	中断	事業費計	年度別内訳(千円)					特例債	備考	No
													15	16	17	18	19			
158	安心安全	消防署西部出張所建替え		徳山	市							0	0	0	0	0	0	戸田	158	
159		北部地域消防署設置検討		徳山	市							0	0	0	0	0	0	須々万、H20着手予定(調査設計)	159	
160		隅田川河川改修事業		徳山	市							53,460	0	15,000	6,600	3,900	27,960	久米	160	
161		黒木川河川改修事業		徳山	市							248,640	57,000	48,000	56,400	56,100	31,140	長穂	161	
162		河川改修		徳新熊	山口県													西光寺川、夜市川、島田川	162	
163		室尾排水ポンプ場改修事業		新南陽	市							4,475	2,452	1,477	546	0	0		163	
164		砂防事業		熊毛	山口県														164	
165		危険ため池整備事業		徳山	市							14,900	13,000	1,900	0	0	0	久米、下上	165	
166		危険ため池整備事業		新南陽	市							52,413	11,103	0	0	10,000	31,310	花見ヶ迫ほか	166	
167		危険ため池整備事業		熊毛	市							69,570	0	0	12,000	40,400	17,170	奥堤ほか	167	
168	危険ため池整備事業		鹿野	山口県													木屋の谷	168		
169	危険ため池整備事業		鹿野	市							34,038	33,028	1,010	0	0	0	前後山、北谷	169		
170	生活環境	交通教育センター建替え事業		全域	市						0	0	0	0	0	0		170		
171		リサイクルプラザの整備		全域	市						36,944	0	0	505	36,439	0		171		
172		資源ごみ処理施設等の整備		新南陽	市						0	0	0	0	0	0		リサイクルプラザで対応	172	
173		ストックヤード整備事業		鹿野	市						0	0	0	0	0	0		173		
174		最終処分場(不燃物埋立処分場)の整備		新南陽	市						0	0	0	0	0	0		N7埋立事業で対応	174	
175		一般廃棄物最終処分場建設事業		鹿野	市						778,030	562,607	215,423	0	0	0		175		
176		し尿処理場の整備		新南陽	市						0	0	0	0	0	0		176		
177	産業廃棄物広域最終処分場の整備		全域	市						4,573	0	0	0	4,573	0		N7埋立事業で対応(廃棄物処理事業団経費)	177		
178	港湾	徳山下松港港湾整備事業		徳山	国													公共岸壁整備(-14m航路、泊地)	178	
179		徳山下松港港湾整備事業		徳山	山口県													公共岸壁整備(-12m岸壁、泊地)	179	
180		徳山下松港港湾整備事業		徳山	山口県													公共岸壁整備(-7.5m岸壁)	180	
181		徳山下松港港湾整備事業		徳新	山口県													公共岸壁整備(埠頭用地、機能施設)	181	
182		徳山下松港港湾整備事業		新南陽	国													公共岸壁整備(-12m岸壁、航路、泊地)	182	
183		徳山下松港港湾整備事業		新南陽	山口県													臨港道路整備(周南大橋)	183	
184		徳山下松港港湾整備事業		徳山	山口県													ポートルネッサンス21(イベント・市民交流広場)	184	
185		徳山下松港港湾整備事業(N7)		全域	山口県														185	
186	徳山下松港港湾整備事業(T10)		徳山	その他														186		
187	産業振興	新たな交流拠点施設整備事業		徳山	山口県														187	
188		農村振興総合整備事業		鹿野	市						261,396	125,140	41,410	94,846	0	0		防災無線、金峰地区交流施設等	188	
189		長穂東部地区ほ場整備事業		徳山	市						97,543	30,650	42,890	24,003	0	0		189		
190		八代西地区ほ場整備事業(県営)		熊毛	山口県														190	
191		石光地区他3地区ほ場整備事業(団体営)		熊毛	市						0	0	0	0	0	0			191	
192		中山間地域総合整備事業(県営)		鹿野	山口県													大潮(圃場整備)	192	
193		青果市場整備事業		新南陽	市						0	0	0	0	0	0		福川南町	193	
194		呼坂地区農免農道建設事業(県営)		熊毛	山口県														194	
195		来巻地区農道整備事業(県営)		熊毛	山口県													呼坂	195	
196		林道開設県営事業(高岳線)		鹿野	山口県													鹿野上~大潮	196	
197	赤松平仏坂線林道開設工事		熊毛	市						0	0	0	0	0	0		八代	197		

No	分野	事業名	LP	対象地区	実施主体	完了	継続実施	着手着手工	検討中	未着手	中断	事業費計	年度別内訳(千円)					特例債	備考	No
													15	16	17	18	19			
198		仏坂山田線林道開設工事		熊毛	市							0	0	0	0	0	0	八代	198	
199		峰畑木屋ノ浴線林道開設工事		徳山	市							60,000	60,000	0	0	0	0	須金	199	
200		芋掘線林道改良工事		鹿野	市							0	0	0	0	0	0	大潮	200	
201		石ヶ谷線林道舗装工事		鹿野	市							8,000	4,000	4,000	0	0	0	鹿野上	201	
202		仁保谷線林道舗装工事		鹿野	市							0	0	0	0	0	0	鹿野上	202	
203		杓・大島漁港修築(杓島漁港)		徳山	市							47,100	47,100	0	0	0	0		203	
204	産業振興	大津島漁港(刈尾)防波堤整備		徳山	市							0	0	0	0	0	0		204	
205		福川漁港建設		新南陽	市							219,104	219,104	0	0	0	0		205	
206		福川漁港関連施設整備		新南陽	市							0	0	0	0	0	0		206	
207		福川漁港利用調整施設整備(長田フィッシャリーナ)		新南陽	市							442,590	70,000	211,569	152,673	8,348	0	H18供用開始	207	
208		大津島(馬島)漁港環境整備		徳山	市							0	0	0	0	0	0		208	
209		福川漁港西樹地区海岸保全施設整備		新南陽	市							1,176,728	50,000	330,000	332,280	357,448	107,000		209	
210		アサリ増養殖養浜造成		徳山	市							67,998	0	0	0	40,998	27,000	大島	210	
211		水産物市場の統合整備		徳新	市							86,805	0	0	0	0	86,805	H19市場統合	211	
212		道の駅の整備		全域	市							590	0	0	0	0	590		212	
												0								
調査対象事業集計						38	50	26	11	81	6	30,514,042	8,248,121	6,609,179	3,964,798	6,289,932	5,402,012	27		

3 財政計画

3 - 1 財政計画の見方

主な収入・支出科目については、以下のとおり。

《歳入》

地方税

市の主な収入で、法人市民税、個人市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など、市の租税に係るもの。

地方交付税等

全国の全ての地方自治体が一定の水準の行政サービスが行えるよう、自治体間の税収等の財源の格差を是正し、必要な財源を保障することを目的に、国から一定の基準に満たない自治体に交付されるもの。

《歳出》

普通建設事業費

道路、橋梁、公園、学校等の公共施設の整備に要する経費で、本調査の対象となっているハード事業に係る経費がこの中に含まれる。

3 財政計画

3-1 新市建設計画(財政計画)と財政実績(決算)との比較

1 歳入

(単位:百万円)

区 分	平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度			15～19年度 計画との差(計)
	新市建設計画	決算額	差	新市建設計画	決算額	差	新市建設計画	決算額	差	新市建設計画	決算額	差	新市建設計画	6月補正後予算額	差	
1 地 方 税	27,898	25,132	-2,766	27,898	25,180	-2,718	27,898	26,631	-1,267	27,898	26,973	-925	27,898	28,257	359	-7,317
2 地 方 譲 与 税	683	737	54	683	1,039	356	683	1,284	601	683	1,858	1,175	683	726	43	2,229
3 地 方 交 付 金	2,475	2,166	-309	2,475	2,405	-70	2,475	2,206	-269	2,475	2,170	-305	2,475	2,301	-174	-1,127
4 地 方 特 例 交 付 金	789	680	-109	789	692	-97	789	736	-53	789	734	-55	789	236	-553	-867
5 地 方 交 付 税 等	9,761	11,487	1,726	9,585	10,274	689	9,610	9,122	-488	9,421	6,759	-2,662	9,576	5,839	-3,737	-4,472
6 交通安全対策特別交付金	39	35	-4	39	33	-6	39	33	-6	39	35	-4	39	35	-4	-24
7 分 担 金 ・ 負 担 金	453	291	-162	453	290	-163	453	304	-149	453	287	-166	453	311	-142	-782
8 使 用 料 及 び 手 数 料	1,854	1,757	-97	1,872	1,765	-107	1,891	1,796	-95	1,910	1,751	-159	1,930	1,834	-96	-554
9 国 庫 支 出 金	6,885	6,208	-677	6,933	5,581	-1,352	6,985	5,169	-1,816	6,808	5,001	-1,807	6,861	4,761	-2,100	-7,752
10 県 支 出 金	2,936	3,820	884	2,951	3,022	71	2,965	3,008	43	2,980	2,911	-69	2,993	3,374	381	1,310
11 財 産 収 入	613	329	-284	613	187	-426	613	336	-277	613	290	-323	613	181	-432	-1,742
12 寄 付 金	1	13	12	1	43	42	1	2	1	1	1	0	1	1	0	55
13 繰 入 金	399	2,146	1,747	1,061	2,755	1,694	322	482	160	0	1,514	1,514	0	1,725	1,725	6,840
14 繰 越 金	0	0	0	0	1,669	1,669	0	2,038	2,038	0	1,410	1,410	0	502	502	5,619
15 諸 収 入	3,865	4,493	628	3,865	3,364	-501	3,865	2,926	-939	3,865	2,923	-942	3,865	2,634	-1,231	-2,985
16 地 方 債	6,480	4,652	-1,828	9,430	4,311	-5,119	6,430	3,054	-3,376	6,430	4,251	-2,179	6,430	4,413	-2,017	-14,519
歳 入 合 計	65,131	63,946	-1,185	68,648	62,610	-6,038	65,019	59,127	-5,892	64,365	58,868	-5,497	64,606	57,130	-7,476	-26,088

2 歳出

区 分	平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度			15～19年度 計画との差(計)
	新市建設計画	決算額	差	新市建設計画	決算額	差	新市建設計画	決算額	差	新市建設計画	決算額	差	新市建設計画	6月補正後予算額	差	
1 人 件 費	14,105	13,846	-259	14,510	13,500	-1,010	14,282	12,500	-1,782	13,322	12,662	-660	13,660	13,031	-629	-4,340
2 扶 助 費	7,231	7,430	199	7,490	7,756	266	7,758	7,821	63	8,036	7,599	-437	8,324	7,904	-420	-329
3 公 債 費	7,114	7,117	3	10,104	6,877	-3,227	6,318	6,478	160	6,099	6,403	304	6,104	6,600	496	-2,264
4 物 件 費	7,546	7,373	-173	7,546	7,402	-144	7,546	7,033	-513	7,546	6,761	-785	7,546	7,418	-128	-1,743
5 維 持 補 修 費	769	629	-140	769	523	-246	769	504	-265	769	505	-264	769	554	-215	-1,130
6 補 助 費 等	5,820	5,559	-261	5,879	5,528	-351	5,937	5,071	-866	5,996	5,301	-695	6,056	5,062	-994	-3,167
7 積 立 金	0	1,413	1,413	0	1,013	1,013	0	2,378	2,378	858	1,451	593	411	103	-308	5,089
8 繰 出 金	8,084	7,676	-408	8,160	7,557	-603	8,237	7,751	-486	7,814	7,228	-586	7,892	7,456	-436	-2,519
9 投 資 及 び 出 資 金	159	273	114	159	210	51	159	159	0	159	118	-41	159	151	-8	116
10 貸 付 金	1,998	1,466	-532	1,998	1,438	-560	1,998	1,401	-597	1,998	1,352	-646	1,998	1,053	-945	-3,280
11 普 通 建 設 事 業 費	12,305	9,057	-3,248	12,033	7,926	-4,107	12,015	5,490	-6,525	11,768	7,351	-4,417	11,687	7,581	-4,106	-22,403
12 災 害 復 旧 事 業 費	0	94	94	0	842	842	0	1,131	1,131	0	585	585	0	116	116	2,768
13 前 年 度 繰 上 充 用 金	0	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344
14 予 備 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	101	101
歳 出 合 計	65,131	62,277	-2,854	68,648	60,572	-8,076	65,019	57,717	-7,302	64,365	57,316	-7,049	64,606	57,130	-7,476	-32,757

3 - 2 主な科目の比較 (グラフ)

