

工事請負契約の一部を変更することについて

平成25年第6回市議会定例会の議決を経て締結した熊毛中学校屋体改築主体工事の請負契約の一部を下記のとおり変更することについて、周南市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成15年周南市条例第52号）第2条の規定により、市議会の議決を求める。

平成26年2月26日 提出

周南市長 木 村 健 一 郎

記

工期「本契約を成立させる旨の意思表示をした日の翌日から平成26年8月8日まで」を「本契約を成立させる旨の意思表示をした日の翌日から平成26年10月10日まで」とする。

契約金額「¥282,450,000-」を「¥294,678,840-」とする。

(参 考)

変 更 概 要

1 工 事 名

熊毛中学校屋体改築主体工事

2 変 更 箇 所

地耐力の不足による地盤改良等の追加

工事請負契約の締結について

下記により工事請負契約を締結することについて、周南市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成15年周南市条例第52号）第2条の規定により、市議会の議決を求める。

平成25年9月3日 提出

周南市長 木 村 健 一 郎

記

- 1 工 事 名 熊毛中学校屋体改築主体工事
- 2 工 事 場 所 周南市大字安田1827番地の1
- 3 工 期 本契約を成立させる旨の意思表示をした日の翌日から
平成26年8月8日まで
- 4 契 約 金 額 ￥282,450,000—
- 5 請 負 者 三和建設・日光組特定建設工事共同企業体
代表者
周南市清水一丁目6番1号
三和建設株式会社
取締役社長 佐藤 正勝
- 6 契 約 の 方 法 条件付一般競争入札

(参 考)

1 工 事 概 要


- (1) 工 事 名 熊毛中学校屋体改築主体工事
- (2) 建 物 概 要
- ア 構 造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨)平屋建て
- イ 建築面積 1, 3 3 1. 5 5 m²
- ウ 延床面積 1, 1 3 7. 7 0 m²
- エ 主要仕上げ 外壁 押出成形セメント板(上部)、コンクリート打放し(下部)
- 屋根 アルミ亜鉛合金メッキ鋼板瓦棒葺き
- オ 主要諸室 アリーナ、ステージ
- 器具庫、更衣室、トイレ、多目的トイレ
- ※ アリーナ競技面
- バレーボール2面
- メインバスケットボール1面
- ミニバスケットボール2面
- バドミントン3面
- (3) そ の 他 渡り廊下、屋外附帯工事

2 入 札 の 状 況

- (1) 応札者数 3者
- (2) 予定価格 3 1 6, 7 8 5, 0 0 0円(税込み)
- (3) 落札率 8 9. 2%

位置図



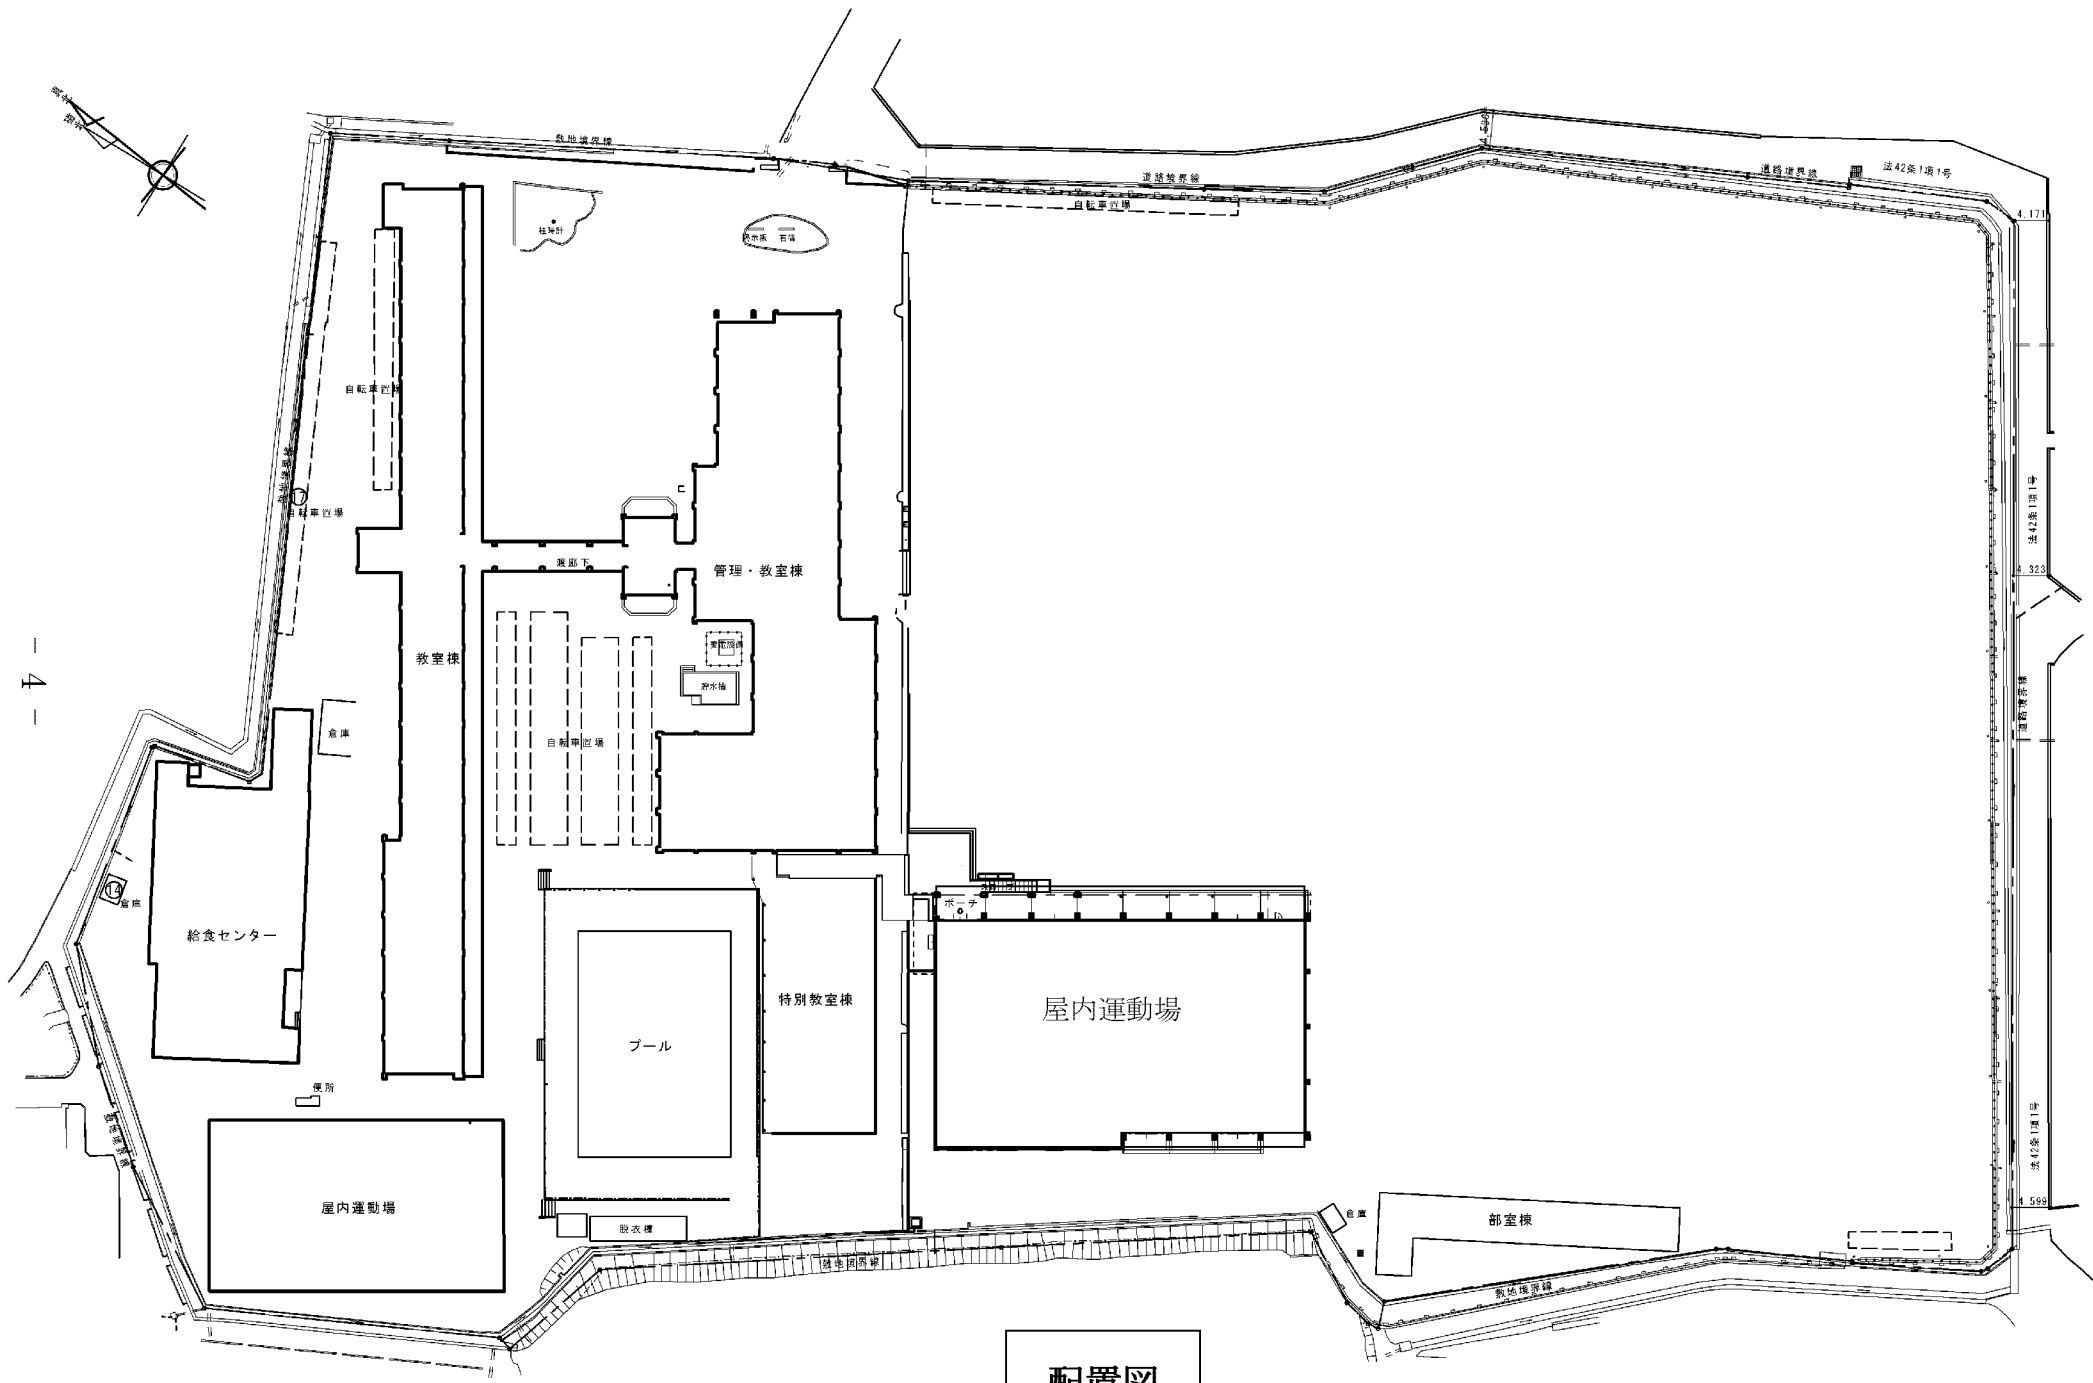

配置図
